浦东科技园 工程简报

第四十六期

中科院上海浦东科技园建设指挥部

上海科技大学建设工程管理部 合编

2015 年 4 月 20 日

中科院上海浦东科技园建设指挥部第十四次工作会议召开

■ “确保今年秋季开学、年底基本建成校园” ■ 把握工作细节，超前部署

4 月 20 日上午，浦东科技园建设指挥部副总指挥、市建交委副主任蒋曙杰主持召开中科院上海浦东科技园建设指挥部第十四次工作会议。上科大副校长华仁长出席了本次会议。

“确保今年秋季开学、年底基本建成校园”是新校园建设的两个重要进度节点，会议要求大学建设工程管理部、上海建工和各参建单位必须重点把握进度目标，细化落实进度计划。会议提出了竣工项目完成竣工备案方能交付使用的要求，要求上海建工总包项目部对移交区域的项目竣工交付时间作出具体的工作部署。

华仁长在讲话中指出上科大建设关系到上海“整合利用高校、企业等科研资源建设科技创新中心张江核心区域”的重要举措，形势紧迫。要求大学建设工程管理部、项目管理公司把握工作细节，超前部署，确保质量和安全，按计划完成高品质新校园的建设。

会议还就设计与施工衔接、幕墙、安装、精装、外总体等问题进行讨论。

学院区——施工概况

物质学院：物质学院C-1(a)区、C-1(b)区、C-1(c)区、C-1(d)区二结构收尾；C2 楼1-3 层二结构施工。二期C-1g 区、C-1f 区二结构施工，C-2b 四框施工**信息学院**： E-1 区a 区四层二结构施工，c 区、d 区内墙抹灰、屋面找坡，幕墙龙骨安装；E-2区3-5 层二结构施工。二期E-3、E-4楼二结构施工。**创管学院**：外墙保温板铺贴，室内墙面粉刷，西侧幕墙施工。**创艺学院**：B-1(a)区二结构施工，B-1(b)区外墙保温板铺贴，B-1(c)区外墙粉刷，B-1(d)区外墙铺贴保温板；10kV变压器、配电屏等安装完成。**生命学院**：地下室局部墙面抹灰，局部外墙抹灰。二期Y 楼七框施工，局部二结构施工。

↑ 图 物质学院中庭

↑ 图 创管学院

↑ 图 信息学院

↑ 图 生命学院

↑ 图 创艺学院

公共教学区——施工概况

图书馆：图书馆局部五层顶板钢筋绑扎，幕墙龙骨安装。**行政中心**：局部二结构施工，幕墙龙骨安装。**公共教室**：公共教室A 区一框施工，B 区基础墙施工。**行政办公楼**：二结构施工，地下室局部地坪浇筑。

↑ 图 图书馆

↑ 图 行政中心

↑ 图 上科大全景

师生生活区——施工概况

本科生宿舍：3号楼室内外装饰基本完成。**专家公寓及教室宿舍**：1号、2号、3号、5号、6号楼室内装饰施工；4号楼外墙人货梯部位保温层、干挂石材施工。**研究生宿舍**：1号——7号楼室内装饰施工，管道安装。**食堂**：1号、2号、3号食堂钢结构打磨、补漆，管道安装。**体育馆**：钢结构屋面桁架梁补批腻子、防火涂装，幕墙龙骨安装。**学生中心**：幕墙龙骨安装，内、外墙面粉刷，管道安装。

→图 体育馆内部

国际交流中心——施工概况

国际交流中心一结构基本完成，二结构施工准备，报告厅座位支模、钢筋绑扎。

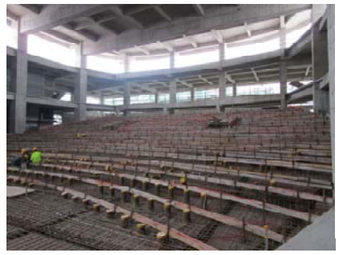

↑图 报告厅

↑图 国际交流中心

互动长廊——施工概况

↑图 互动长廊中部钢结构吊装完成

景观河道、桥梁——施工概况

↑图 食堂 1 号楼西侧河道档土墙

↑ 图 专家公寓人行桥基础

H 楼——施工概况

H-1A 一框施工，H-1B 楼、H-2 楼二结构施工基本完成。

↑ 图 H-1A 楼

（本期图片由上海科技大学建设项目管理公司胡胜威提供 施工概况据 2015 年 4 月 17 日统计资料）

本期发放范围：上海市重大办 、浦东科技园建设指挥部、上科大建设工程管理部、管理公司；监理、总包项目部
